


Spraaktechnologie

Voor mensen met een stemaandoening en mensen die stotteren



De technologie


Technologie en app die fluisteren omzet naar een natuurlijke stem, zodat (video)bellen ontspannen en effectiever verloopt

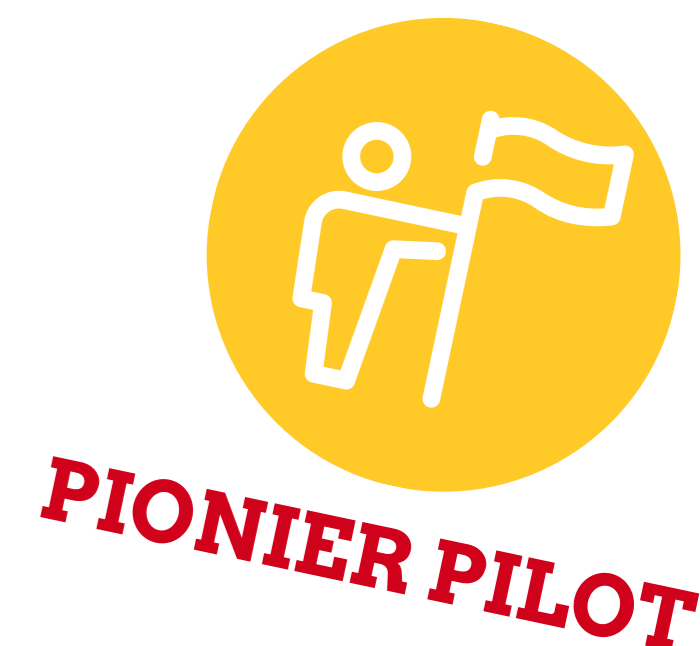

Implementatiereis

De belangrijkste momenten bij de implementatie van de technologie in het bereiken van het doel


VISIE & STRATEGIE

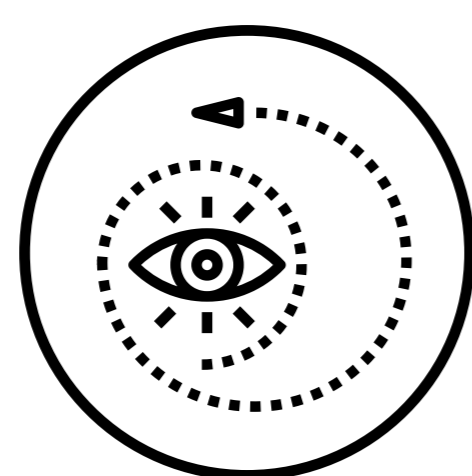

VANAF MAART 2021

- ✓ Kennismaking en gesprekken UWV
- ✓ Aanscherping visie op toegevoegde waarde van Whispp op de werkvloer


PLANVORMING

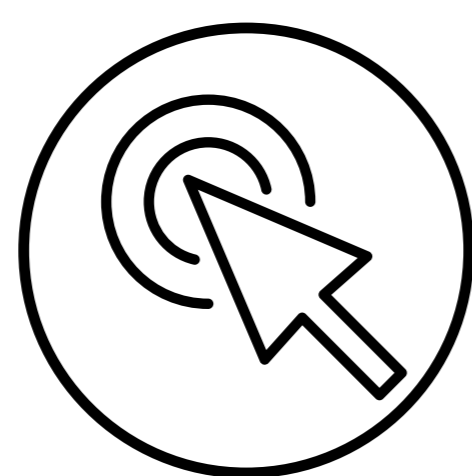

VANAF MEI 2021

- ✓ Benaderen pilot partners
- ✓ Gezamenlijke visie, aanpak en rollen
- ✓ Opstellen en indienen CTI Call

ONTWIKKELING

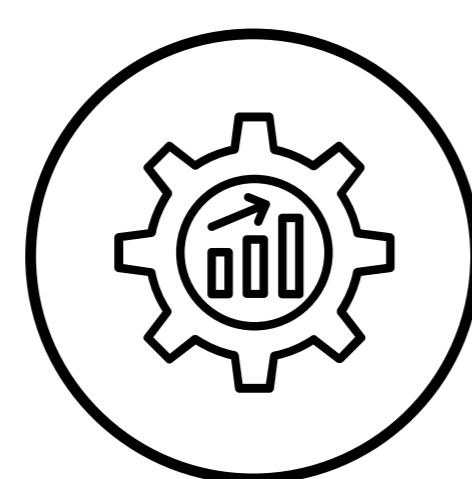

VANAF BEGIN 2022

- ✓ Whispp gebruiksklaar maken
- ✓ Testen bij doelgroep en doorontwikkelen
- ✓ Communicatie en werving deelnemers
- ✓ Technische tegenslagen en lessen

Vertraging opgelopen door technische tegenslagen op gebied van gebruiksvriendelijkheid technologie




← Mei 2023

NU EN IN DE TOEKOMST

- ✓ Doorontwikkelen en lanceren technologie
- ✓ Testen bij doelgroep
- ✓ Messenger lanceren als marketing teaser
- ✓ Investeerders benaderen
- ✓ Handleiding en promotiemateriaal verspreiden

Stakeholders optimistisch over technologie

UITVOERING & EVALUATIE

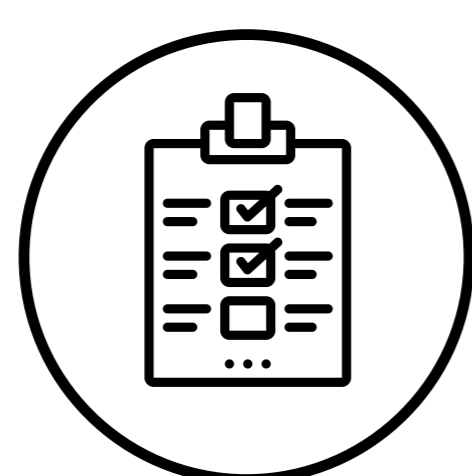

OPSCHALING







Geleerde lessen

De belangrijkste geleerde lessen bij de implementatie van de technologie

De financiering van de technologie is een uitdaging, maar er wordt veel energie gestoken in het bezoeken en werven van investeerders.

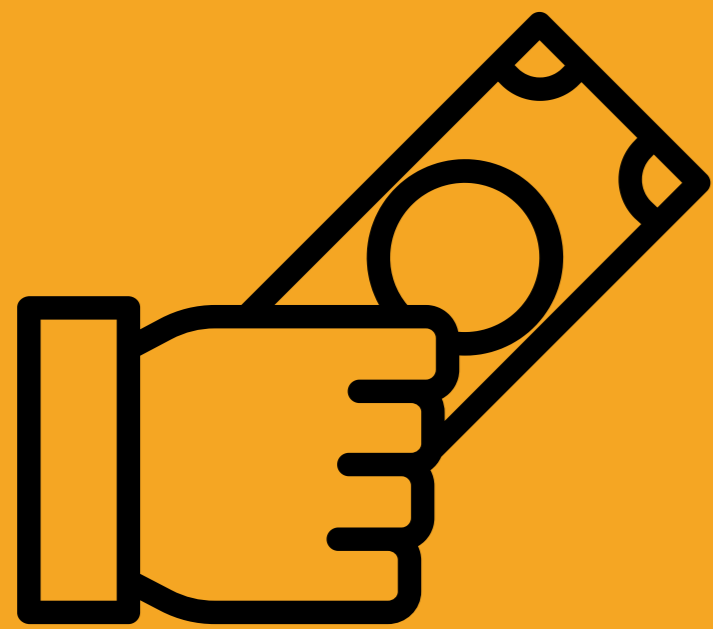

Aan optimisme bij stakeholders en deelnemers ontbreekt het niet. Wel kan het vertrouwen bij reeds geworven deelnemers wegnemen door de vertraging en tegenslagen in de ontwikkeling van de technologie.

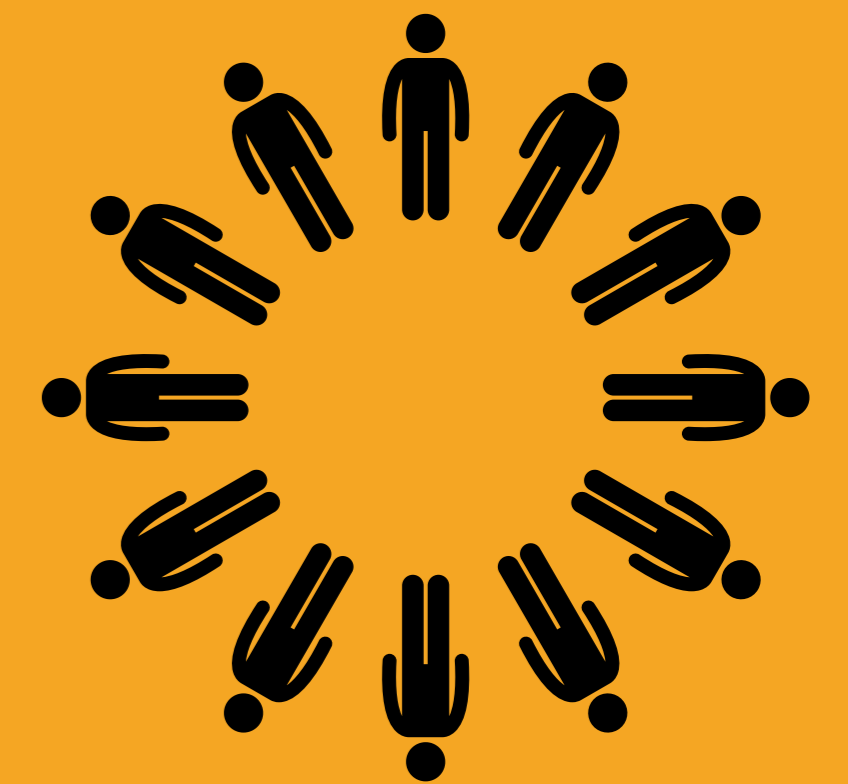

Als blijkt dat niet alle beoogde functionaliteiten binnen de projectperiode haalbaar zijn, dan doorzetten met "minder opgetuigde kerstboom" om wel te testen en te kunnen (door)ontwikkelen.



Andere (tussen)oplossingen worden gelanceerd om de technologie en ontwikkeling daarvan "levend" te houden, totdat de technologie zelf in gebruik kan gaan.

Alleen versterken van fluisteren sluit onvoldoende aan op behoeften van mensen die stotteren: zonder natuurlijk stemgeluid weinig animo onder mensen die stotteren voor de toepassing.



Neem voldoende tijd voor de (door)ontwikkeling van de technologie voordat deelnemers geworven worden.



Zorgen over AVG bij werkgevers blijft een terugkomend thema.



Door technologische tegenslagen zijn effectmetingen niet mogelijk gebleken in het onderzoek. Daar tegenover staat dat het proces erg leerzaam is.

Conclusie

De pilot is in de ontwikkelingsfase. De technologie heeft erg veel lessen opgeleverd met betrekking tot het proces en de ontwikkeling van een pionier pilot. Projectpartners, deelnemers en stakeholders zijn optimistisch over de technologie. Ook internationaal is er interesse in dit soort technologieën.
